

PHASAGES ET DEVIATIONS

Période générale de travaux de la semaine 45 à la semaine 14 incluse :

Du Lundi 06 Novembre 2023 au Vendredi 05 avril 2024.


3 phases successives : A, B et C



PHASAGES ET DEVIATIONS

Phase A et B : Période de travaux de la semaine 45 à semaine 51.


Du Lundi 06 Novembre 2023 au Vendredi 22 Décembre 2023.

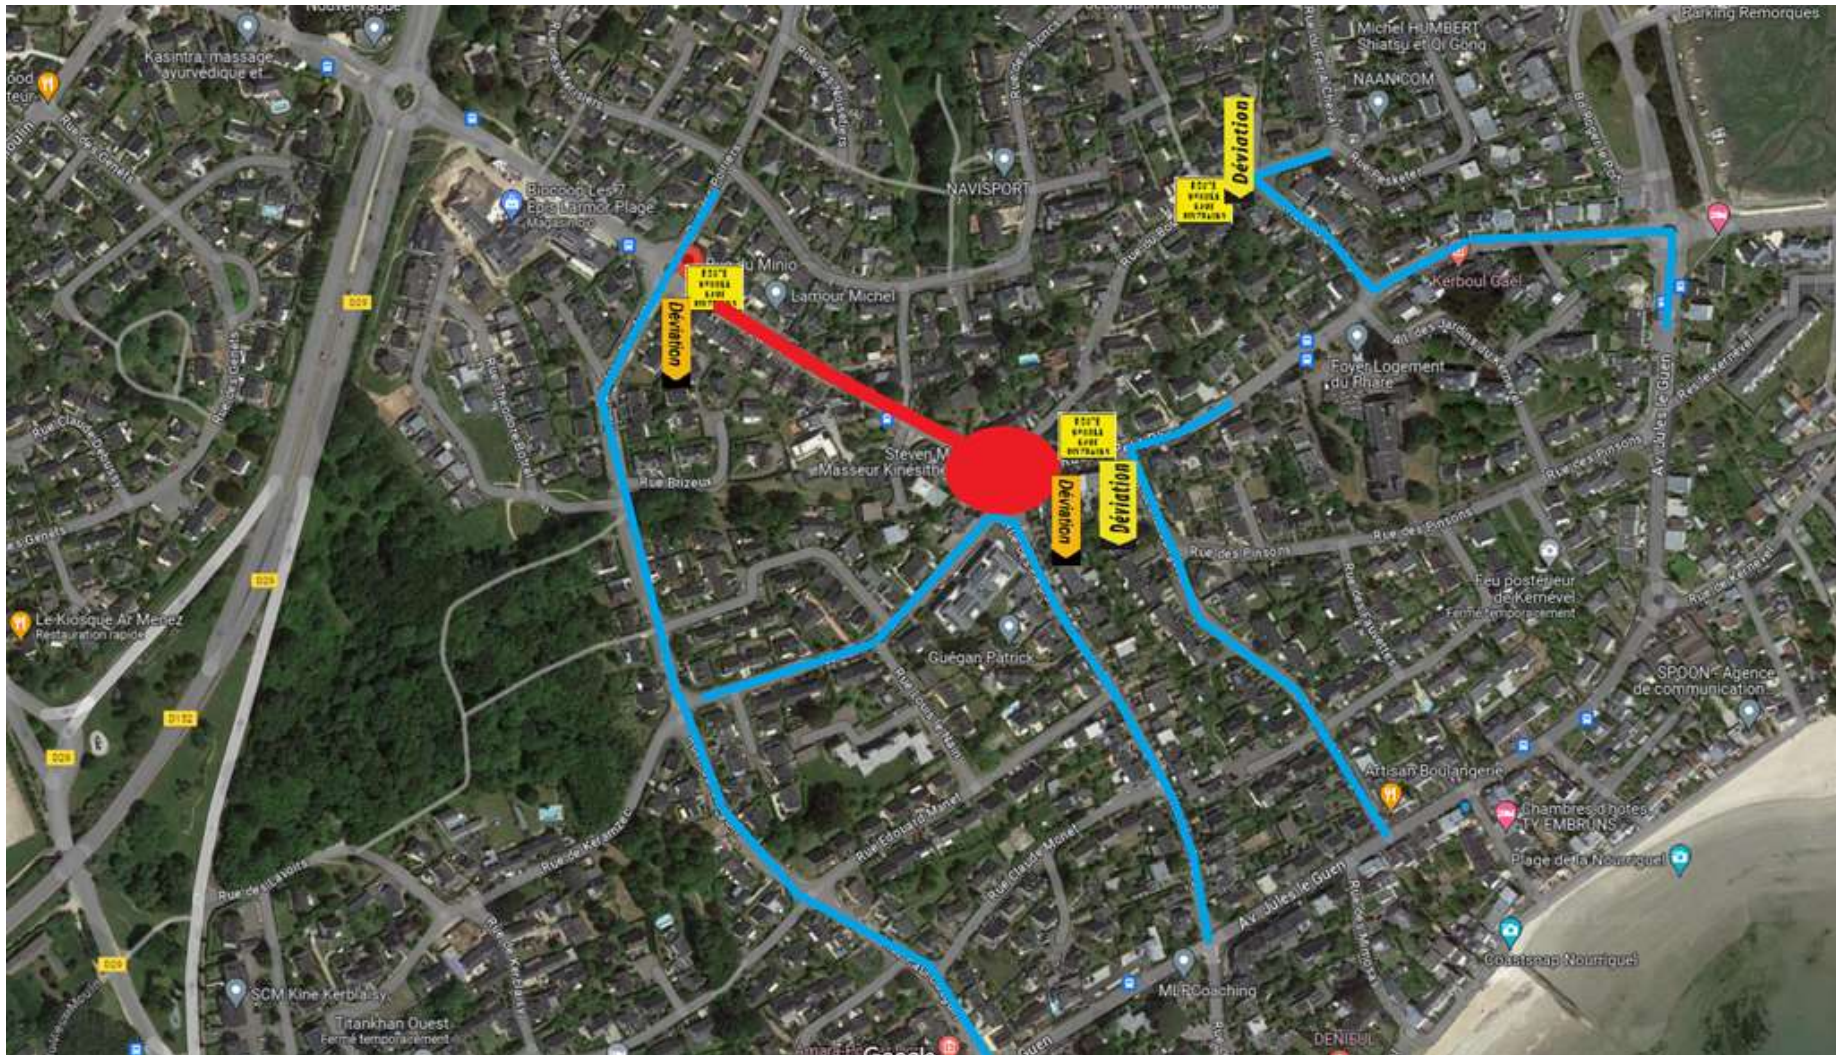

PHASAGES ET DEVIATIONS

Phase C, 1^{ère} partie : Période de travaux de la semaine 2 à la semaine 3

Du Lundi 08 Janvier au Vendredi 19 janvier 2024.

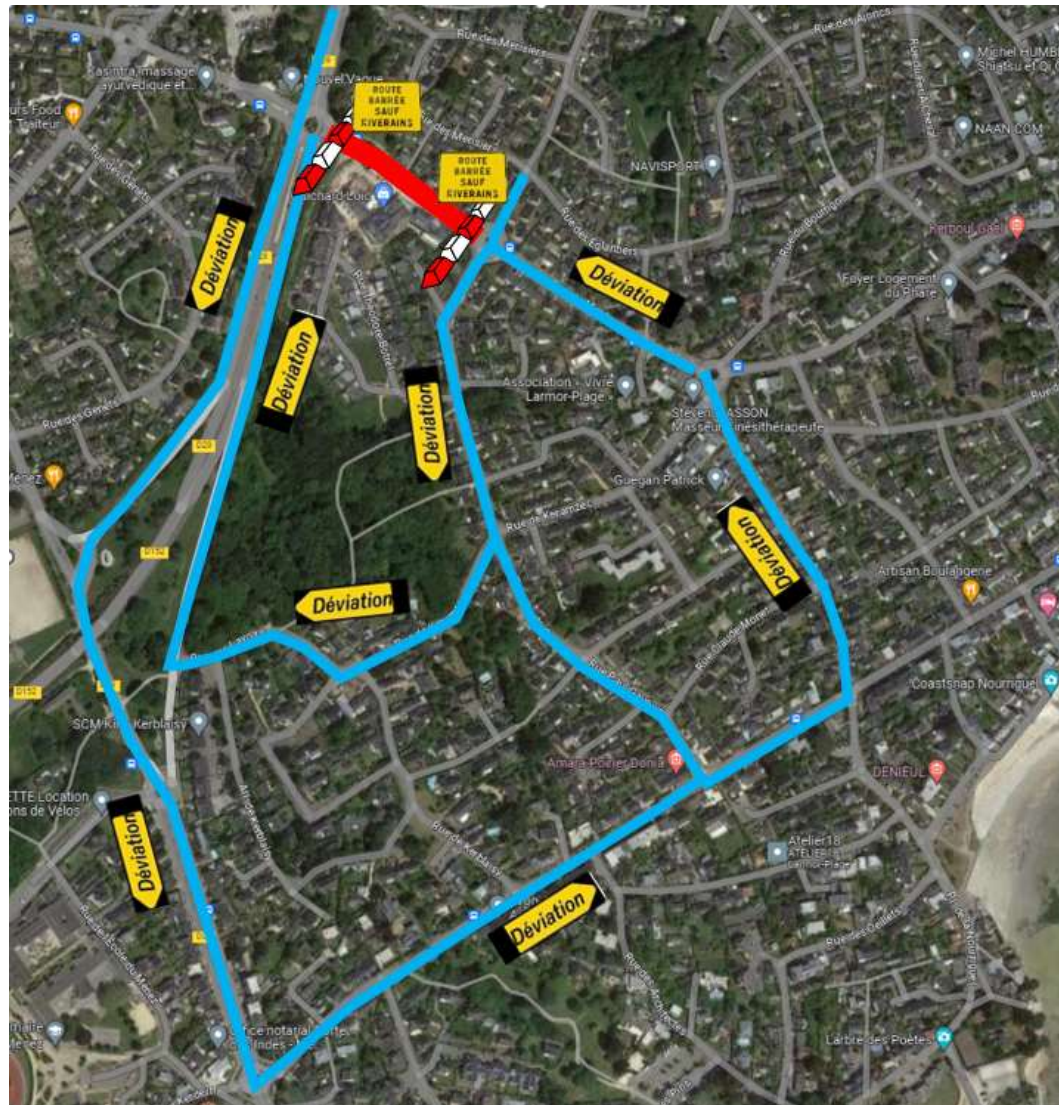


PHASAGES ET DEVIATIONS

Phase C, 2^{de} partie : accès BioCoop et riverains ponctuellement perturbé,

Phase E, pavage voirie: Période de travaux de la semaine 4 à la semaine 9

Du Lundi 22 Janvier au Vendredi 01 mars 2024.

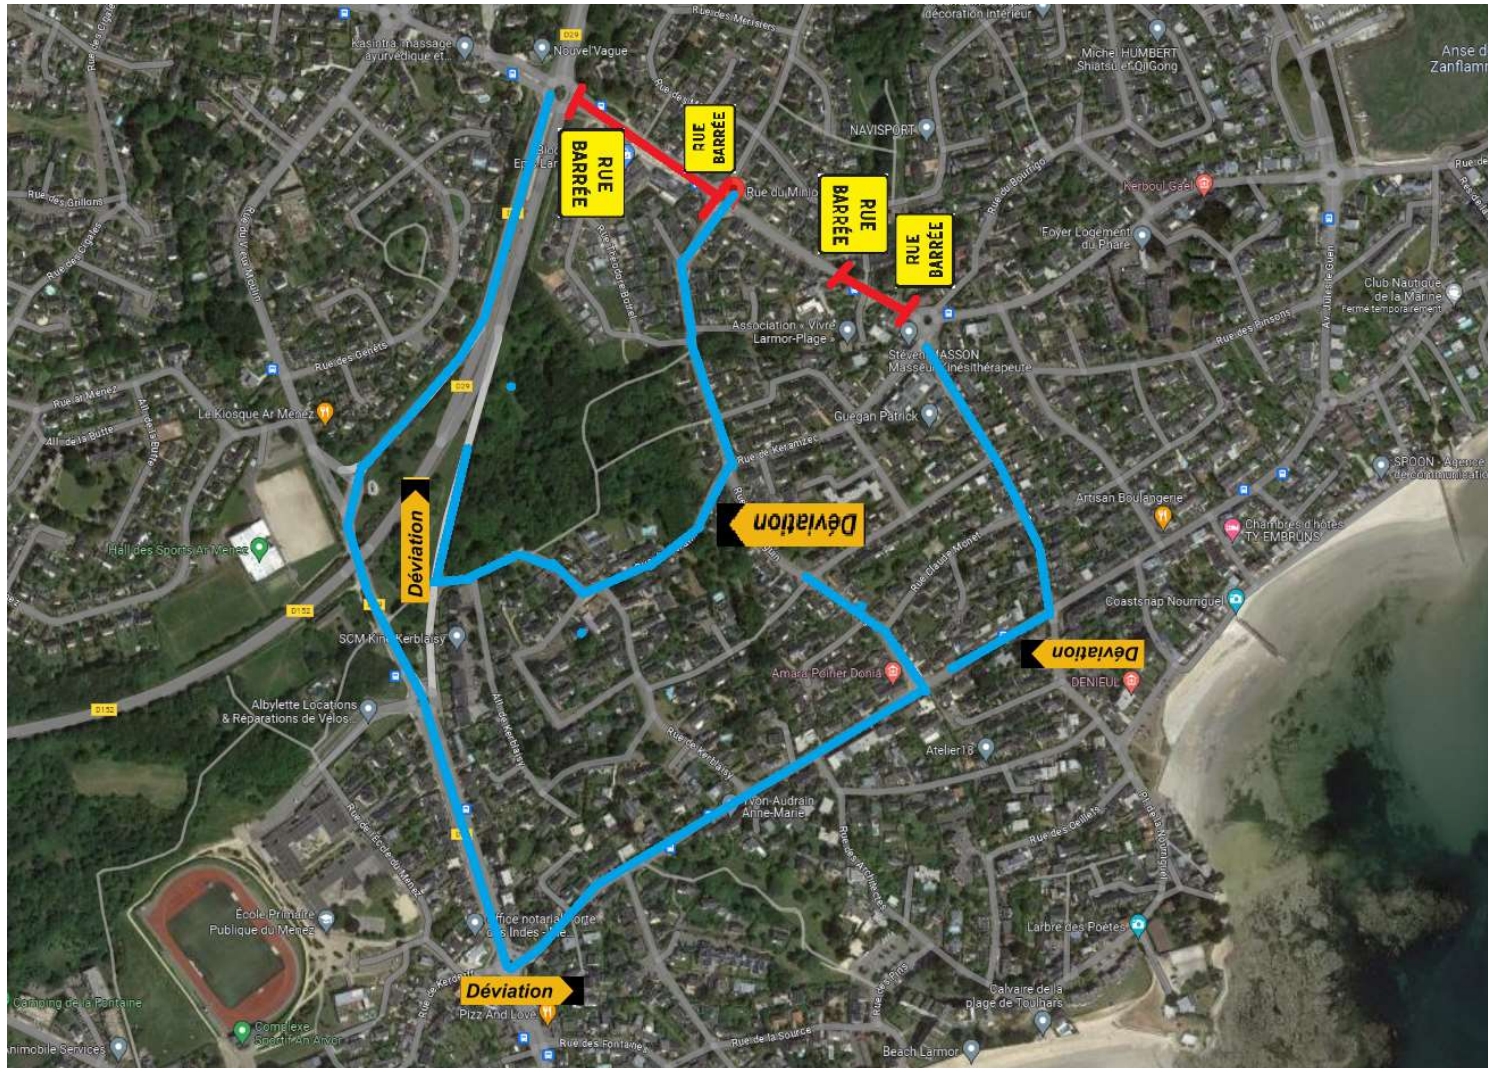

PHASAGES ET DEVIATIONS

Compte tenu de la nature des travaux des phases **d'enrobés de voirie, de signalisation, d'embellissement de voirie et d'espaces vert** et du caractère glissant des ateliers de mise en œuvre de ceux-ci, nous mettrons en place les déviations à l'avancement en fonction de chaque zone de travail des phases ci-dessus en fonction de l'ampleur des ateliers **de la semaine 10 à la semaine 14 incluse.**

Du Lundi 04 Mars au Vendredi 05 Avril 2024. (Suivant conditions météorologiques)

